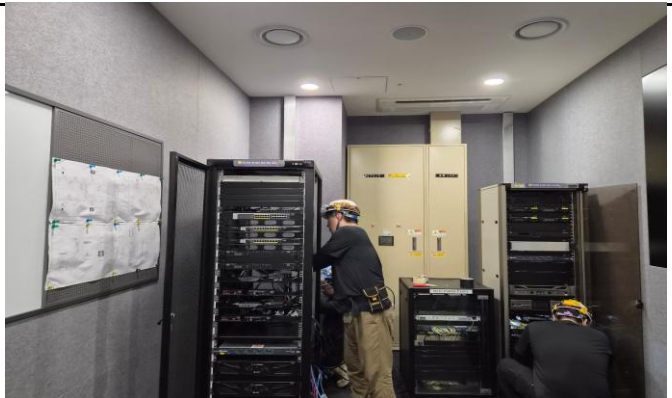


공 사 일 보									
공 사 명		DSR B타워 1층 강당 및 컨퍼런스 A홀 AV시스템 구축				전체 공정률		5%	
주요 작업 내용		장비 철거							
□ 업 체 명 :		㈜서울영상테크				□ 작 성 자 :		문승균 과장	
□ 공사기간 :		2026-08-05 ~ 2026-10-31				□ 작성일자 :		2026년 8월 5일 수요일	
공 정 관 리	총 괄								
	공무 / 안전								
	투입 자재								
이슈 및 협의사항		- 200"스크린 차주 자원순환센터 폐기 예정							
구 분		금일 작업 현황				다음 작업 현황			
작업 내용		■ 장비철거 1. A홀 - 200" 천장 매립 스크린 철거 - 천장 반매립 스피커 철거_2EA - 24"모니터, 구즈넥 마이크 철거 및 포장 보관_32EA 2. B,C홀 - 150"전동노출 스크린, 천장봉타입 프로젝터 철거_2EA - 실링마이크_4EA, 실링스피커_8EA, 화상회의카메라_2EA 철거 3. 조정실 - A홀, BC홀 시스템랙 철거 및 보관 - 콘솔데스크철거 및 보관 - 55"DID 철거 및 포장 보관_6EA - 조정실 바닥 케이블 철거				- 천장 배관 포설			
인 력 현 황	업체명	서울영상테크	RTA			서울영상테크	외부업체		
	주 간	3	3			3	5		
	소 계	6				8			
	업체명								
	야 간								
	소 계	0				0			
비 고									
작업 사진									
									
A홀 장비 철거					BC홀 장비 철거				
									
콘솔데스크 철거					시스템랙 철거				
